

**Päivitysesitys  
Tampereen Raitiotie Oy:n  
osakassopimuksen liitteisiin  
6.1 b ja 6.1 c**

12.11.2024




**Tampereen  
Ratikka**

# Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentaminen – alustava toteutusjärjestys

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman (helmikuu 2021) yhteydessä laadittiin arvio Tampereen raitiotien ratahaarojen toteutusjärjestyksestä ja rakentamisaikataulusta.

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättivät 21.10.2024 Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien vaiheittaisesta rakentamisesta. Vaiheistuksesta johtuen tulevien ratahaarojen rakentamisen tavoiteaikataulua on päivitetty seuraavaksi:

- Pirkkala–Linnainmaa, rakentaminen vaiheessa 1: 12/2024–8/2028 ja vaiheessa 2: 5/2028–1/2032
- Lielähti–Ylöjärvi, rakentaminen 2032–2035
- Linnainmaa–Lamminrahka, rakentaminen 2036–2039
- Hatanpää–Vuores, rakentaminen 2030/2040-luvulla

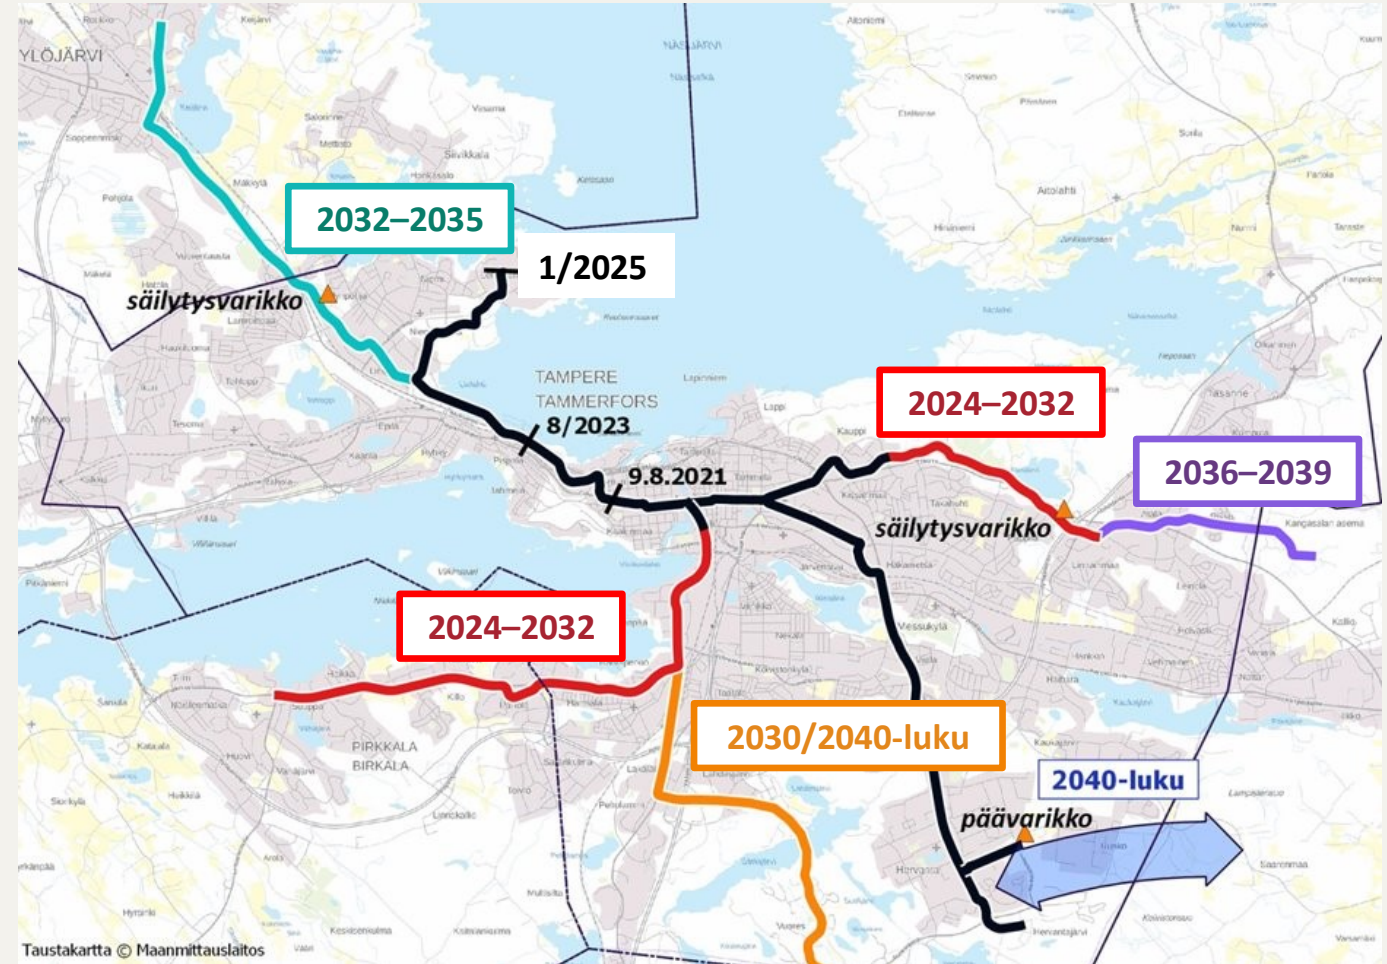




## Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä 12.11.2024



Vuosi 20..	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Pyynikintori– Lentävänniemi	2b 21.10.2024																			
Pirkkala– Linnainmaa		vaihe 1						vaihe 2												
Lielähti– Ylöjärvi	AK																			
Linnainmaa– Lamminrahka																				
Rantaperkiö– Vuores																				

Yleissuunnittelu, yleiskaavoitus	Hankesuunnittelu*, asemakaavoitus	Toteutussuunnittelu*, kustannukset	Rakentamisvaihe	Liikennöinti- ja ylläpitovaihe
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

\*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Valtuustotason päätökset:

-  Yleissuunnitelman hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun 2
-  Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun
-  Rakentamispäätös 2 Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

-  Toteutussuunnittelun hankintavaihe
-  AK Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu maankäytön asemakaavahankkeiden yhteydessä
